


## Monitoring Bericht 02/2020

### LAG Mühldorfer Netz

Die Monitoring-Aktivitäten der LAG Mühldorfer Netz finden gemäß den Anforderungen der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES unter Punkt 7.2. Seite 57-61) statt. Verantwortlich für die Aufstellung ist das LAG Management, das in regelmäßigen Abständen die Gremien des Vereins über die Aktivitäten unterrichtet (siehe beigefügtes Schaubild).

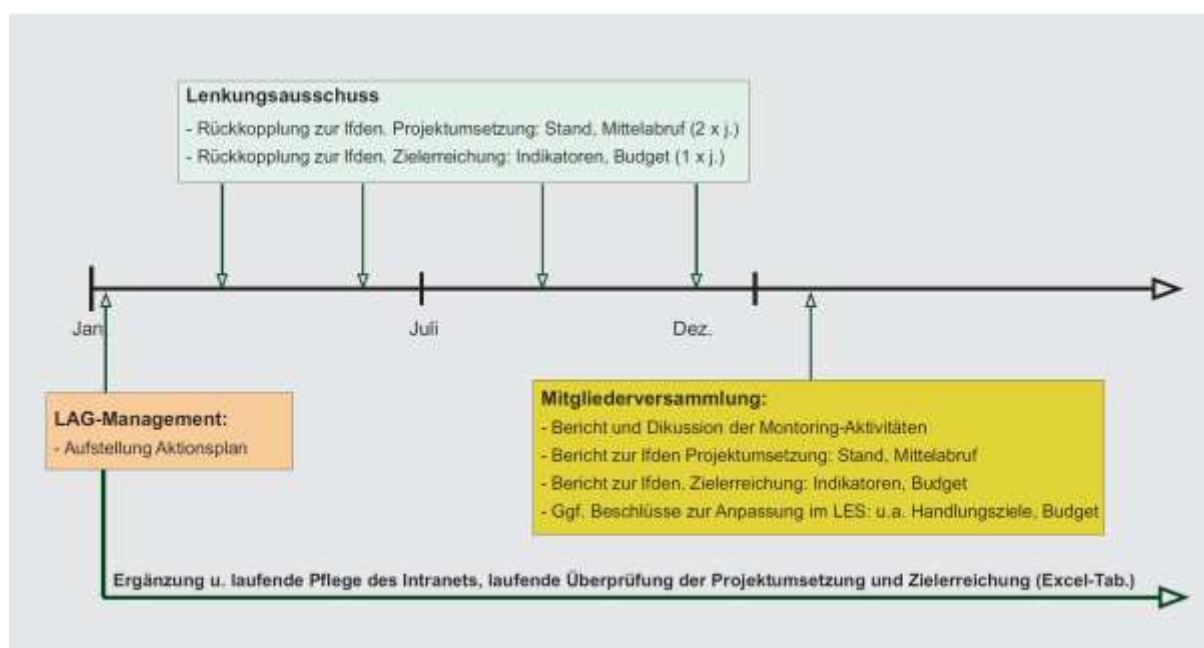

In den nachfolgenden Ausführungen werden die einzelnen Monitoring-Bestandteile näher beschrieben und dokumentiert.

Monitoring-instrument/-Baustein	Umsetzung
<b>Aktionsplan</b>	Der Aktionsplan wird jährlich auf der Mitgliederversammlung im Rahmen des Geschäftsberichts des LAG-Managements mit den Mitgliedern besprochen und für das jeweilige nächste Jahr, ggf. auch darüber hinaus beschlossen.  Den aktuellen Aktionsplan für 2020 findet man in der Anlage 1.
<b>Intranet</b>	Das Intranet wird für die Projektentwicklung, wie auf den Seiten 57 und 58 beschrieben, durchgeführt und ist das Herzstück der

Monitoring-instrument/-Baustein	Umsetzung
	Projektarbeit. Hierin sind alle Projekte seit 2009 zentral abgelegt und dokumentiert.
<b>Zielsystem und Monitoring Tabelle zur Identifizierung der Zielerreichung</b>	Das Zielsystem und die Monitoring Tabelle zur laufenden Zielerreichung dient zur Überwachung der Zielerreichung und findet man in der Anlage 2. Diese strategische Überwachung dient v.a. für ein strategisches Zielcontrolling zur Vorbereitung von Evaluierungshandlungen.
<b>Monitoring Tabelle zur laufenden Projektumsetzung und Mittelabruf</b>	Die Monitoring Tabelle zur laufenden Projektumsetzung und Mittelabruf siehe Anlage 3 wird in abgewandelter Form bei Lenkungsausschusssitzungen und Mitgliederversammlungen aufgezeigt bzw. als Anlage versandt und gibt einen Überblick über die laufenden Projektaktivitäten.
<b>Projektfortschrittsberichte</b>	Die Projektfortschrittsberichte sind integraler Bestandteil des Werkraumes im Intranet und werden bei den Projektträgern eingefordert. Muster siehe Anlage 4.
<b>Monitoring im Bereich des Vorgehens</b>	<p>Das Vorgehen zur Projektentwicklung ist über die Durchführungsstruktur „in sechs Schritten von der Idee zum erfolgreichen Abschluss“ in der Lenkungsausschusssitzung am 06.05.2009 beschlossen worden.</p> <p>Dies stellt in der Praxis die Arbeitsgrundlage in der Projektentwicklung dar.</p> <p>Aktivitäten zur Vernetzung und Einbindung von neuen Partnern fanden in vielfacher Hinsicht statt, und werden in den jährlichen Aktionsplänen (Anlage 1) und Tätigkeitsnachweisen dokumentiert.</p>
<b>Basisinformationen</b>	<p>Neben der Orientierung an den festgelegten Handlungszielen und Indikatoren sind für den Bereich der Strategie v.a. folgende Basisinformationen von Bedeutung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Projekte nach Entwicklungs-/Handlungszielen und Jahren</li> <li>- Mittelabruf pro Entwicklungsziel</li> <li>- Anzahl der Projektträger sowie der eingebundenen Partner (Netzwerke)</li> </ul> <p>Die Basisinformationen werden über die Monitoring Tabelle zur laufenden Zielerreichung (siehe Anlage 2) und über die Monitoring Tabelle zur laufenden Projektumsetzung (siehe Anlage 3) überwacht.</p>

<b>Monitoring-instrument/-Baustein</b>	<b>Umsetzung</b>
	<p>Im Bereich des Vorgehens (Prozess, Methode, Ö-Arbeit) werden u.a. folgende Basisinformationen zugrunde gelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anzahl der Beratungstermine</li><li>- Erfassung der Veranstaltungen u. a. nach Typ Themen und Anzahl</li><li>- Anzahl der Netzworkebildungen im Rahmen der Projektentwicklung</li></ul> <p>Erfassung und Monitoring erfolgt über Tätigkeitsberichte des LAG-Managements und dem Aktionsplan (siehe Anlage 1)</p>
<b>Datengenerierung</b>	Die Datengenerierung erfolgt über die eigene Erfassung des LAG-Managements.
<b>Dokumentation</b>	Die Dokumentation erfolgt über das Intranet, über die in der Anlage befindlichen Monitoring Tabellen (siehe Anlage 1, 2 und 3) und über die Sitzungsprotokolle aus Lenkungsausschuss und Mitgliederversammlung sowie den Evaluierungstätigkeiten.

gez. Sascha Schnürer  
LAG Management Mühldorfer Netz e.V.

Anlage 1: Aktionsplan (Monitoring-Baustein)

Aktionsplan 2015 - 2020 Mühldorfer Netz		2020			
		1	2	3	4
<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>				
	<b>AELF Meilensteine</b>				31.12.2020
1.	<b>Strategiemonitoring / Gesamtsteuerung</b>				
1.2.10.	Gesamt-Evaluierung mit Evaluierungsbericht (Fragebogenaktion, WS, Bericht)				
1.2.11.	Vorbereitung MV und Rückkoppelung Vorstand		April?		Okt.?
1.2.12.	Mitgliederversammlungen 2020 (ordentl. und ausserordentl.)		Mai? + Wahl		Nov.?
2.	<b>Projektentwicklung</b>				
2.3.	<b>PE Abschöpfung</b> ( Bearbeitung Sonderprojekte nach Erreichung der Meilensteine, Schwerpunkt liegt hier spätestens auf das Erreichen der soften Ziele und ganzheitlicher Strategie, Hebung von Potential durch Kooperationsprojekte)				
2.3.1.	5 LEK Termine (Lenkungskreis Sitzungen mit Projektbewilligung)	05.02.2020	22.04.2020		
2.3.2.	Rücksprache Strategiemonitoring / Projektträger reguläre Projekte				
2.3.3.	Projektentwicklung analog best. / adaptierter Durchführungsstruktur (vgl. "transp. Projektablauf von der Idee bis zur Beantragung")				
3.0.	<b>Projektentwicklung</b>				
3.0.1.	Berichterstattung bei regulären LEK Terminen (Lenkungskreis)				
3.0.2.	Erstellung Präsentation für Projektentwicklung & -abwicklung				
3.0.3.	Erstellung und Aktualisierung "Monitoring-Bericht"				
3.0.4.	Aktualisierung & Überwachung Intranet "Projektentwicklung"				
3.0.5.	Erinnerungen & Mahnfunktion Projektmanager, Stellungnahmen, AELF				
3.0.6.	Hotline für Projektmanager (laufende Anfragen, Richtlinienänderungen etc.)				
3.0.7.	Hotline für Stakeholder (insb. Vorstand, AELF, MV, LEK)				
4.0.	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
4.0.1.	Berichterstattung bei regulären LEK Terminen (Lenkungskreis)				
4.0.2.	Entwicklung & Abstimmung PR Konzept auf Basis LES				
4.0.3.	Entwicklung & Abstimmung Corp. Ident. (Leitbild etc. 2015-2020) auf Basis LES				
4.0.4.	Erstellung Startflyer (Konzeption)				
4.0.5.	Anpassung Internetseite (Start und laufende red. Beiträge, sprich Pflege)				
4.0.6.					
4.0.7.	Anpassung Intranet (Zielvorgabe & Überwachung)				
4.0.8.	Inhaltliche Beiträge Netz In Form (7 Ausgaben)				
4.0.9.	Inhaltliche Beiträge Bilanzierung (2 Ausgaben)				
4.0.10.	Zuarbeit und Vorbereitung von Veranstaltungen (siehe Strategiemonitoring) inkl. Korrespondenz, Einladungen, Erstellung von Roll Ups, Pinwänden, Hinweisschildern, Power-Point-Präsentationen, Protokollen				
<b>Bedeutung der Farben:</b>					
	LEK-Termine				
	Öffentlichkeitsarbeit				
	Evaluierungsmaßnahmen				
	Projekte				
	Mitgliederversammlung/Vorstandssitzung				
	Meilenstein				
	Überschriften bzw. für dieses Jahr nicht relevant				

Anlage 2: Monitoring Tabelle zur Identifizierung der Zielerreichung (Monitoring-Baustein)

Entwicklungs-/ Handlungsziele	Quantitative Indikatoren	Zielgrößen	Terminierung	Zielerreichung (erreichte Zielgrößen)					Status Zielerreichung (Ja/Nein)	Handlungsempfehlung
				2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Entwicklungsziel 1</b>										
HZ 1.1: Es werden mind. drei Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit und Stärkung der Aufenthaltsfunktion in öffentlichen Räumen durchgeführt.	I 1.1.: Anzahl der durchgeführten Maßnahmen.	3	1 bis 2018 2 bis 2020	0	0	0	3		Ja	Durchführung Ideenwettbewerb zu Barrierefreiheit wurde nicht unterstützt. Andere Förderprogramme zielen auf ähnliche Handlungsziele ab. 2019: Callisthenics Anlage Haag, Kneippbecken Ecksberg, Freizeitgelände Kraiburg
HZ 1.2: Aufbau und Weiterentwicklung von mind. drei Angeboten zur Sicherung und Verbesserung von Daseinsvorsorgestrukturen und generationenübergreifenden Treffpunktmöglichkeiten vor Ort.	I 1.2: Anzahl der aufgebauten oder weiterentwickelten Angebote.	3	2 bis 2018 1 bis 2020	0	2	0	4		Ja	2017: Bürgerengagement, Indoorerlebnis Oberreith 2019: Naturbad Kraiburg, Freizeitgelände Kraiburg, Jugendfreizeitanlage Neumarkt, Kneippbecken Ecksberg, Keine Aktivität erforderlich.
HZ 1.3: Durchführung von mind. zwei Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung und Unterstützung bei der Entwicklung von gemeinschaftlichen Wohnformen.	I 1.3: Anzahl der durchgeführten Aktivitäten.	2	1 bis 2018 1 bis 2020	0	0	0	0		Nein	Bis 2-2020 nicht erreicht. Projekte zu Gemeinschaftliche Wohnformen Diskussion mit den Gemeinden führen.
HZ 1.4: Aufbau eines Nahmobilitätskonzeptes mit der Elektromobilität als wichtigen Baustein	I 1.4: Vorhandenes Mobilitätskonzept und Anzahl der	1 3	bis 2018 1 bis 2018 2 bis 2018	0	0	0	0		Nein	E-Mobilitätskonzept wurde nicht entwickelt. ÖPNV-Konzept wird ohne

Entwicklungs-/ Handlungsziele	Quantitative Indikatoren	Ziel-größen	Terminierung	Zielerreichung (erreichte Zielgrößen)					Status Zielerreichung (Ja/Nein)	Handlungsempfehlung
				2016	2017	2018	2019	2020		
sowie Schaffung von mind. 3 Einrichtungen.	geschaffenen Einrichtungen.									Leader-Förderung weiterentwickelt.
HZ 1.5 Aufbau und Weiterentwicklung zielgruppenspezifischer Angebote im Umgang mit neuen Medien und Technologien im ländlichen Raum	I 1.5.1: 1 LAG flächendeckendes, dezentrales Betreuungsangebot „Medienbildung für Jugendliche“ I 1.5.2: 1 Landkreisweites Netzwerk „Medienbildung“ je Landkreis	1  1		1					Nein	Projekt „MedienMobil 4.0“ ist nicht zu Stande gekommen
<b>Entwicklungsziel 2</b>										
HZ 2.1: In mind. drei Gemeinden wurde das generationenübergreifende Hilfsangebot auf Grundlage von bürgerschaftlichem Engagement weiterentwickelt oder verbessert.	I 2.1: Anzahl der Gemeinden.	3	1 bis 2018 2 bis 2020	0	0	0			Nein	Startprojekte wurden nicht umgesetzt. Verein Ehrensache weiterhin eng in Kontakt bleiben. Projektanfrage über AWO nachverfolgen.
HZ 2.2: Aufbau von mind. zwei Angeboten zur Umsetzung der Inklusion auf lokaler Ebene – unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppen Kinder und hochaltrige Menschen.	I 2.2: Anzahl der aufgebauten Angebote.	2	1 bis 2018 1 bis 2020	0	1	0	4		Ja	4 in 2019 durch Ecksberg, Neumarkt und Haag, Rattenkirchen ü/Dorferneuerung > Ansatz zur Umsetzung über Bürgerengagement realistisch.

Entwicklungs-/ Handlungsziele	Quantitative Indikatoren	Ziel-größen	Terminierung	Zielerreichung (erreichte Zielgrößen)					Status Zielerreichung (Ja/Nein)	Handlungsempfehlung
				2016	2017	2018	2019	2020		
HZ 2.3: Auf- und Ausbau von mind. zwei Angeboten zur alltagsnahen Unterstützung und Integration von ausländischen Mitbürgern.	I 2.3: Anzahl der auf- und ausgebauten Angebote zur Unterstützung.	2	1 bis 2018 1 bis 2020	0	0	0	0		Nein	Projektentwicklung über Leader unrealistisch. Aktivitäten werden über andere Förderprogramme abgewickelt.
<b>Entwicklungsziel 3</b>										
HZ 3.1: Schaffung und Weiterentwicklung von mind. drei Erlebnisangeboten zur Stärkung der dezentralen Erholungsfunktion im Zuge abgestimmter Aktivitäten.	I 3.1: Anzahl der neu geschaffenen oder weiterentwickelten Angebote.	3	2 bis 2018 1 bis 2020	2	1	3	7		Ja	Handlungsziel über Bayerisches Thermenland und Radwegenetz-Inn-Salzach, Ebinger Urelefant, Rattenkirchen ü/Dorf-erneuerung, Naturbad Kraiburg, GPS-Touren erfüllt. Kneippbecken Ecksberg und Freizeitgelände Kraiburg. Hier wurden nur die Projekte als Indikatoren gezählt. In Summe werden bis zu 15 neue Angebote (=Touren) erstellt.
HZ 3.2: Durchführung von mind. drei Maßnahmen zur Aufwertung der Flusstäler als zentrale Achsen für ein naturnahes Erlebnisangebot im Landkreis Mühldorf a. Inn.	I 3.2: Anzahl der durchgeführten Maßnahmen.	3	1 bis 2018 2 bis 2020	1	1	3	2		Ja	Handlungsziel über Radwegenetz-Inn-Salzach und Bayerisches Thermenland, Ebinger Urelefant erfüllt. In 2019 Naturbad und Freizeitgelände Kraiburg
HZ 3.3: Gezielte Aufwertung und Ergänzung von mind. zwei vorhandenen touristischen Angeboten	I 3.3: Anzahl der aufgewerteten oder ergänzten	2	1 bis 2018 1 bis 2020	2	2	2	5		Ja	Handlungsziel über Bayerisches Thermenland und Radwegenetz-Inn-Salzach, GPS-Touren

Entwicklungs-/ Handlungsziele	Quantitative Indikatoren	Ziel-größen	Terminierung	Zielerreichung (erreichte Zielgrößen)					Status Zielerreichung (Ja/Nein)	Handlungsempfehlung
				2016	2017	2018	2019	2020		
unter besonderer Berücksichtigung von Vermittlungs-, Vernetzungs- und Vermarktungsaktivitäten.	touristischen Angebote.									erfüllt. Ab 9/2019 zusätzlich Ecksberg.
<b>Entwicklungsziel 4</b>										
HZ 4.1: Schaffung und Weiterentwicklung von mind. zwei Angeboten zur Stärkung der Volkskultur unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppen Kinder und Jugendliche.	I 4.1: Anzahl der neu geschaffenen oder weiterentwickelten Angebote.	2	1 bis 2018 1 bis 2020	1	0	2			Ja	Handlungsziel mit Schlossturm Leuchten erreicht. 2018 weitere Projekte über Bürgerengagement, z. B. Kulturfahrt Trachtenverein, Theaterverein Mittergars
HZ 4.2: Aufbau und Weiterentwicklung von mind. drei Angeboten zur Vermittlung und Erlebarmachung von Natur und Umwelt.	I 4.2: Anzahl der neu aufgebauten / weiterentwickelten Angebote.	3	2 bis 2018 1 bis 2020	1	1	5	6		Ja	Handlungsziel über Radwegenetz Inn-Salzach, erfüllt. 2018 weitere Projekte über Bürgerengagement, z. B. Waldlehrpfad, -rallye, OGV Mößling, + Ebinger Urelefant, Kitzretter und GPS-Touren 2019 + Rattenkirchen ü/Dorferneuerung
HZ 4.3: Durchführung von mind. zwei Vermittlungs- und Vernetzungsaktivitäten zur besseren Darstellung der vorhandenen Angebote nach innen und aussen.	I 4.3: I 4.3.1 Anzahl der vorgenommenen Vernetzungs- und Vermittlungsaktivitäten 4.3.2 Anzahl der beteiligten Gruppen	2 10	1 bis 2018 1 bis 2020 bis 2020	2 15	0 0	2 2			Ja	Handlungsziel über Schlossturm Leuchten bereits erfüllt. 2018 weitere Projekte über Bürgerengagement, z. B. Website Jagd, Theaterverein Mittergars,



Entwicklungs-/ Handlungsziele	Quantitative Indikatoren	Ziel-größen	Terminierung	Zielerreichung (erreichte Zielgrößen)					Status Zielerreichung (Ja/Nein)	Handlungsempfehlung
				2016	2017	2018	2019	2020		
HZ 4.4: Durchführung von mind. zwei Maßnahmen zur ländlichen Strukturverbesserung im Sinne von Land-, Dorf- und Flurentwicklung.	I 4.4: Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	2	1 bis 2018 1 bis 2020	1	1	1	2		Ja	In 2018 Handlungsziel über Radwegenetz Inn-Salzach, 2019 Naturbad Kraiburg erfüllt. Ratten über Dorferneuerung.
HZ 4.5: Erhalt und Stärkung des heimischen Artenreichtums in der Pflanzen- und Tierwelt zur Bewahrung unserer Natur- und Kulturlandschaft für zukünftige Generationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl der neu aufgebauten oder weiterentwickelten Aktivitäten und Angebote.</li> <li>Anzahl aufgewerteter Räume</li> </ul>	0				1	1		Ja	Projekt „Unsere Heimat – unser Wild“ und evtl. Koop. „Unsere Heimat – unser Wild 2.0“ in 2020

## Anlage 3: Monitoring Tabelle zur laufenden Projektumsetzung und Mittelabruf (Monitoring-Baustein)

Projektstand und Mittelabruf Leader-Projekte 2015 – 2020, Stand: 27.02.2020								
Projekttitle	Einordnung Projekt	Zuordnung Handlungsziel	Querschnittsstrategie	Genehmigte Projektkosten (gesamt)	Fördersumme (Leader)	Mittelabruf	Projektstatus	Bemerkungen Umsetzungsstand
<b>Entwicklungsziel 1</b>								
Mehrgenerationengarten Schwindingg	EP	HZ 1.1			18.000,00*		Warten auf PT	In Planung
Barrierefreier Dorfsaal Reichertsheim	EP	HZ 1.1			200.000,00*		Warten auf PT	Keine Co-Finanzierung
Bewegte Schulen und Kindergärten	EP	HZ 1.2			9.000,00*		Warten auf PT	
Unterstützung Bürgerengagement	EP	HZ 1.2 und HZ 2.2		8.889,20	8.000,00	0,00	bewilligt	Gesamt 22.223,00 und 20.000,00 Anteil EZ1: 40%)
Indoorerlebnis Oberreith	EP	HZ 3.3 mit HZ 1.2		332.485,97	40.000,00	40.000,00	bewilligt	(1.662.429,85 / 200.000 EZ1: 20%)
Multifunktionaler Allwetterplatz TSV Buchbach	EP	HZ 1.2			200.000,00*		Warten auf PT	B-Plan-Verfahren
Multifunktionaler Allwetterplatz WAW	EP	HZ 1.2			200.000,00*		Warten auf PT	Standortsuche
Multifunktionaler Allwetterplatz FC	EP	HZ 1.2			200.000,00*		Anfrage	Standortsuche
Naturbad Kraiburg	EP	HZ 1.2 mit HZ 3.1		609.068,74	120.000,00*		bewilligt	40% zu EZ 3, 60% zu EZ 1
Naturbad Aschau					100.000,00*		Warten auf PT	


Projektstand und Mittelabruf Leader-Projekte 2015 – 2020, Stand: 27.02.2020								
Projekttitel	Einordnung Projekt	Zuordnung Handlungsziel	Querschnittsstrategie	Genehmigte Projektkosten (gesamt)	Fördersumme (Leader)	Mittelabruf	Projektstatus	Bemerkungen Umsetzungsstand
Generationenplatz Jettenbach	EP						Idee	Auf PT warten – Termin mit Reingrubber und Exkursion Babensham
Kneippbecken Ecksberg		HZ 1.2;1.1;2.2;3.1;3.3		84.996,58	11.131,21		bewilligt	EZ 2 28.000 €
Barrierefreie Dorfmitte Zangberg							Warten auf PT	Projektidee
Jugendfreizeitanlage Neumarkt - St.Veit		HZ 1.2, 2.2		178.554,32	86.727,39		bewilligt	EZ 1 100%
Freizeitgelände Kraiburg		HZ 1.2; 1.1; 3.1; 3.2		433.831,64	181.893,21		bewilligt	EZ 1, EZ 3 11.220 €
Calisthenics Anlage Haag		HZ 1.1, 1.2, 2.2		46.641,83	23.516,88		bewilligt	EZ 1 100%
Ganzjahresfreizeitgelände Ampfing		HZ 1.2; 1.1; 3.1					Warten auf PT	Projektidee
<b>Summe EZ 1 (geplanter Budgetanteil: 480.110,00 €)</b>				<b>1.694.468,28</b>	<b>471.268,69</b> <b>927.000,00*</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>Entwicklungsziel 2</b>								
Unterstützung Bürgerengagement	EP	HZ 1.2 und HZ 2.2		13.333,80	12.000,00	0,00	VZ	Gesamt 22.223 € mit 20.000 € (Anteil EZ 1: 40%)
AWO	EP	HZ 2.1					Anfrage	Keine Quantifizierung mgl.
Kneippbecken Ecksberg	EP	HZ 1.2; 1.1; 2.2; 3.1; 3.3		100.000,00	28.000,00		beantragt	EZ 1 11.131,21 €; EZ 2 28.000 €
<b>Summe EZ 2 (geplanter Budgetanteil: 40.000,00 €)</b>				<b>113.333,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>		

Projektstand und Mittelabruf Leader-Projekte 2015 – 2020, Stand: 27.02.2020								
Projekttitel	Einordnung Projekt	Zuordnung Handlungsziel	Querschnittsstrategie	Genehmigte Projektkosten (gesamt)	Fördersumme (Leader)	Mittelabruf	Projektstatus	Bemerkungen Umsetzungsstand
<b>Entwicklungsziel 3</b>								
Koop. Radwegesetz Inn-Salzach – Planung (1)	KP	HZ 3.1 in Verbindung mit 3.2, 3.3., 4.2, 4.3, 4.4		113.050,00	68.135,24	0,00	bewilligt	79.135,00 lt. Förderbescheid
Koop. Radwegesetz Inn-Salzach – Beschilderung (2)	KP	HZ 3.1 in Verbindung mit 3.2, 3.3., 4.2, 4.4		274.975,80	90.630,60	27.816,04	bewilligt	151.051,00 lt. Förderbescheid (EZ3: 60%)
Koop. Radwegesetz Inn-Salzach – erstmalige Öffentlichkeitsarbeit (3)	KP	HZ 3.1 / ff		197.738,14	100.161,47	4.055,65	bewilligt	100.161,47 lt. Förderbescheid (EZ 3 100%)
Koop. Radwegesetz Inn-Salzach-Weiterentwicklung ADFC (4)	KP	HZ 3.1 / ff		118.981,79	68.491,55		bewilligt	68.491,55 lt. Förderbescheid (EZ 3 100%) Phase 4 neu Gesamtausgaben wurden gekürzt um 3.661,07 €
Naturbad Aschau	EP	HZ 3.1 mit 1.2			100.000,00*		Warten auf PT	
Ebinger Urelfant	EP	HZ 3.2		24.412,85	12.309,00	9.372,00	abgeschlossen	Konzeptförderung
Koop. Radwegesetz bay. Thermenland	KP	HZ 3.3 mit HZ 3.1		3.924,13	1.936,42	0,00	bewilligt	
Indoorerlebnis Oberreith	EP	HZ 3.3 mit HZ 1.2		1.329.943,88	160.000,00	160.000,00	abgeschlossen	
Interaktive Erlebnistouren	EP	HZ 3.1, 3.3, 4.2		60.333,00	29.520,00		bewilligt	25% zu EZ 4 und 75% zu EZ 3
Naturbad Kraiburg	EP	HZ 1.2, 3.1, 4.4		406.045,83	80.000,00		bewilligt	40% zu EZ 3, 60% zu EZ 1

Projektstand und Mittelabruf Leader-Projekte 2015 – 2020, Stand: 27.02.2020								
Projekttitel	Einordnung Projekt	Zuordnung Handlungsziel	Querschnittsstrategie	Genehmigte Projektkosten (gesamt)	Fördersumme (Leader)	Mittelabruf	Projektstatus	Bemerkungen Umsetzungsstand
Freizeitgelände Kraiburg					11.220,00		bewilligt	EZ 1 und EZ 3
<b>Summe EZ 3 (Budgetanteil: 630.000 )</b>				<b>2.529.405,30</b>	<b>622.404,28</b> <i>100.000,00*</i>	<b>169.372,00</b>		
Entwicklungsziel 4								
Schlossurm-Leuchten Haag – Marke	EP	HZ 4.1 mit HZ 4.3		69.000,00	41.400,00	0,00	bewilligt	
Koop. Radwegnetz Inn-Salzach – Beschilderung (2)	KP	HZ 3.1 in Verbindung mit 3.2, 3.3., 4.2, 4.4		183.317,20	60.420,40	0,00	bewilligt	Neu festgesetzte Zuwendung lt. Zahlungsbescheid 168.922,82 € (ursprünglich 175.414 €)
Kitzretter	EP	HZ 4.2		41.912,82	20.981,38	18.144,04	Bewilligt	
Interaktive Erlebnis-touren	EP	HZ 3.1, 3.3, 4.2		20.111,00	9.840,00		Bewilligt	25% zu EZ 4 und 75% zu EZ 3
<b>Summe EZ 4 (Budgetanteil: 150.000,00)</b>				<b>314.341,02</b>	<b>132.641,78</b>	<b>0</b>		
LAG-Management								
Erstellung LES	EP			31.323,18	10.000,00	10.000,00*	bewilligt	
LAG-Management	EP			534.231,50	247.890,00	157.022,18	bewilligt	
<b>Summe LAG-M. (Budgetanteil: 257.890,00)</b>				<b>565.554,68</b>	<b>257.890,00</b>	<b>167.022,18*</b>		
<b>Summe Total (1.597.776,00 Orientierungswert)</b>				<b>5.217.103,20</b>	<b>1.524.204,75</b>			
<b>Freie Budgetmittel auf Basis des Orientierungswertes für weitere Projektentwicklung 2020,</b>					<b>73.571,25</b>			

Blau\* = errechneter Planstand / Rot\* = geschätzter Planstand, Projekte in Ideen- oder Entwicklungsstadium 02/2020

Anmerkung: Projekte enthält nur Projekte mit Leader-Förderung. Projekte, die in Zusammenhang mit der LAG / LES stehen, jedoch ohne eine Leader-Förderung abgewickelt wurden, sind aus Vereinfachungsgründen in dieser Monitoring-Liste nicht erfasst (z.B. Projekt ohne Förderung, EUREGIO- oder ELER-Projekte).

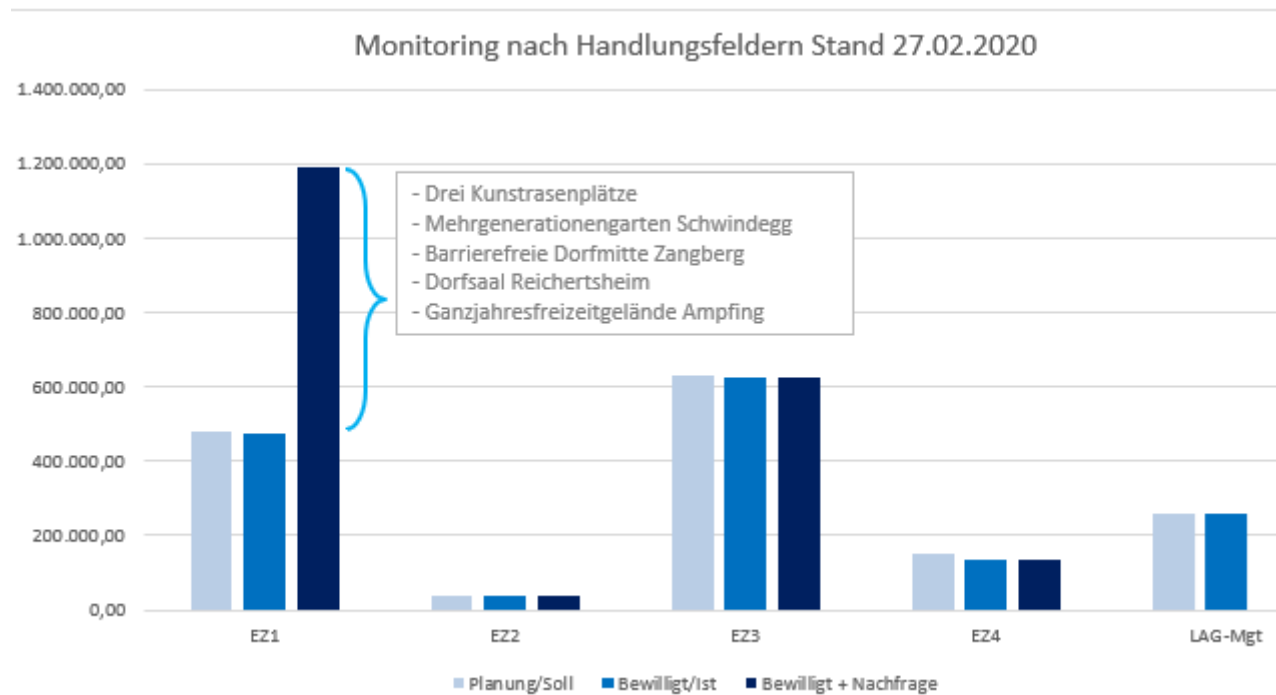

**Grafische Auswertung und Fazit 2/2020:**

Die vom Lenkungsausschuss befürwortete Fördersumme beträgt Stand 27.02.2020 rund 1,524 Mio Euro aus einem Orientierungswert in Höhe von 1'598 Mio Euro. Die Nachfrage übersteigt das vorhandene Budget in EZ 1 deutlich.

Im **Entwicklungsziel 1** „Daseinsvorsorge“ herrscht seit Ende 2017 die größte konkrete Mittelnachfrage in Form von Infrastrukturprojekten.

Das Budget von **EZ 2** „soziale Netze“ ist aufgebraucht.

Das Budget von **EZ 3** „Freizeit“ zeigt noch Restmittel in Höhe von rund 7 T€.

Im **EZ 4** „Heimat“ bleibt noch ein Rest des Budgets von 17 T€

Der Meilenstein 10/2019 wurde erfüllt. Die LAG erhielt eine Budgetaufstockung in Höhe von 39.776 €. Eine Zuordnung dieser Mittel zu einem Entwicklungsziel entscheidet der Lenkungsausschuss mit seiner nächsten Projektbefürwortung. Die bisher getrennt betrachteten Budgets für Einzel- und Kooperationsprojekte können nun nach Bedarf für beide Projektarten eingesetzt werden.

Die LAG hat künftig die Möglichkeit, auch nach Ausschöpfung ihres neuen Orientierungswertes weitere Projekte auszuwählen. Über die Genehmigung und die damit verbundene Budgetaufstockung entscheidet das StMELF im Einzelfall in Abhängigkeit von den dann bayernweit noch verfügbaren Restmitteln (sog. „Windhundverfahren“). Mit diesem finanziellen Spielraum könnte die LAG noch weitere Projektideen für die Entwicklung des Landkreises unterstützen.

## Anlage 4: Muster Projektfortschrittsbericht (Monitoring-Baustein)

Projektfortschrittsbericht				
<b>Projektbezeichnung:</b>		<b>Zuordnung- Entwicklungs-/Handlungsziel (LES):</b>		
<b>Träger des Projekts:</b>		Ansprechpartner/ Projektleiter:		Datum:
<b>Projekttablauf (Übersicht):</b>				
Einzelmaßnahmen	Geplanter Ablauf		Tatsächl./effektiver Ablauf	
	Geplanter Beginn	Geplanter Abschluss	Tatsächlicher Beginn	Tatsächlicher Abschluss
<b>Berichtszeitraum:</b>				
<b>Fortschritt / erfolgte Schritte / Maßnahmen</b> (seit Beginn bzw. letztem Fortschrittsbericht):				
<b>Soll-Ist-Vergleich</b> (Entspricht der Ist-Stand den Planungen? Ja: Ist-Stand entspricht den Planungen; Nein: auftretende Abweichungen)				
Inhaltlich (Ziele, Maßnahmen)		Zeitlich (Ablauf)		Finanziell (Budget)
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
<b>Ggf. kurze Erläuterung von Abweichungen, auftretenden Schwierigkeiten</b> (Gründe?)				
<b>Ggf. kurze Bewertung von Abweichungen</b> (Auswirkungen auf das Projekt?)				
<b>Erstellung Teilverwendungsnachweis (Abschlagsauszahlung, siehe Anhang):</b>				
Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>				
siehe Formular <u>Auszahlungsantrag und Verwendungsnachweis</u>				
Ggf. kurze Erläuterung:				
